		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs	Noms des ressources	sam. 20 mai 0 6 12 18
1		Evaluation des besoins via...	0,312 jours	23/05/23 19:00	25/05/23 15:30		Margaux;Julien;Julian;Erwan	
2		Analyse comparative	0,5 jours	25/05/23 15:36	27/05/23 16:06	1	Julien	
3		Charte Graphique	0,125 jours	25/05/23 15:30	25/05/23 16:30	1	Julien	
4		Diagramme de Classe	0,25 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 14:30	1	Margaux;Erwan	
5		Diagramme d'activité	0,375 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	1	Julian	
6		Création de données de te...	0,375 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	1	Margaux	
7		Données de Prestation	0,016 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	5;4	Margaux;Julien;Julian;Erwan	
8		Données de Facture	0,016 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	5;4	Margaux;Julien;Julian;Erwan	
9		Données de Réservation	0,016 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	5;4	Margaux;Julien;Julian;Erwan	
10		Maquettage	0,375 jours	29/05/23 19:00	01/06/23 15:00	3	Margaux	
11		Interface de Recherche	0,375 jours	03/06/23 12:00	05/06/23 20:00	10	Margaux;Julien	
12		Interface d'Affichage	0,312 jours	03/06/23 16:00	06/06/23 20:00	10	Margaux;Julian	
13		Tests unitaires	0,25 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 11:00	11;12	Julien	
14		Tests d'acceptations	0,25 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00	12;11	Erwan	
15		Tests d'ergonomie	0,25 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00	11;12	Julian	
16		Fonctions d'affichage	0,567 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 15:02	12;7;9;8;11	Margaux;Julien	
17		Fonctions d'enregistrement	0,375 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 11:00	9;11;7;12;8	Margaux;Julien	
18		Fonctions de recherche	0,594 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 15:15	8;7;11;12;9	Margaux;Julien	
19		Rapport de bugs	0,375 jours	10/06/23 11:00	10/06/23 16:30	13;14;15	Erwan	

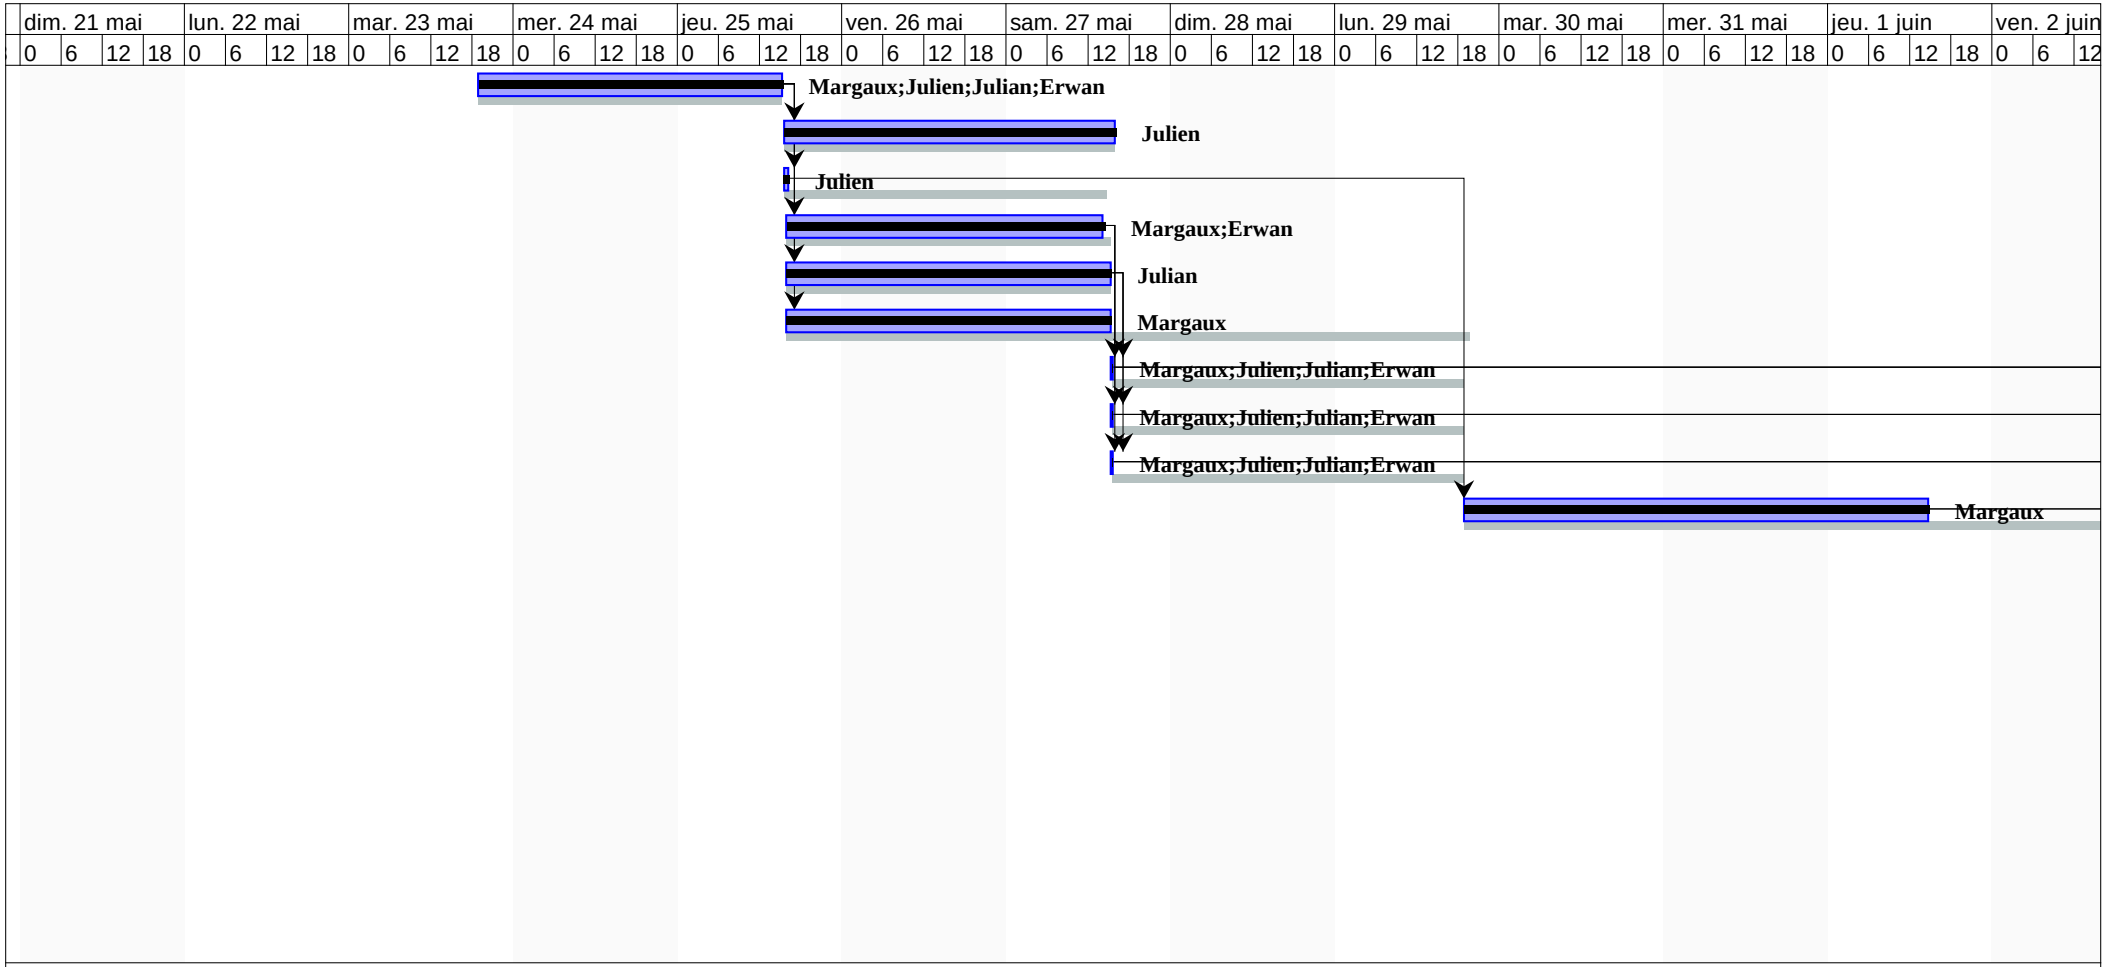
dim. 21 mai
lun. 22 mai
mar. 23 mai
mer. 24 mai
jeu. 25 mai
ven. 26 mai
sam. 27 mai
dim. 28 mai
lun. 29 mai
mar. 30 mai
mer. 31 mai
jeu. 1 juin
ven. 2 juin
0 6 12 18
Margaux;Julien;Julian;Erwan
Julien
Julien
Margaux;Erwan
Julian
Margaux
Margaux;Julien;Julian;Erwan
Margaux;Julien;Julian;Erwan
Margaux;Julien;Julian;Erwan
Margaux

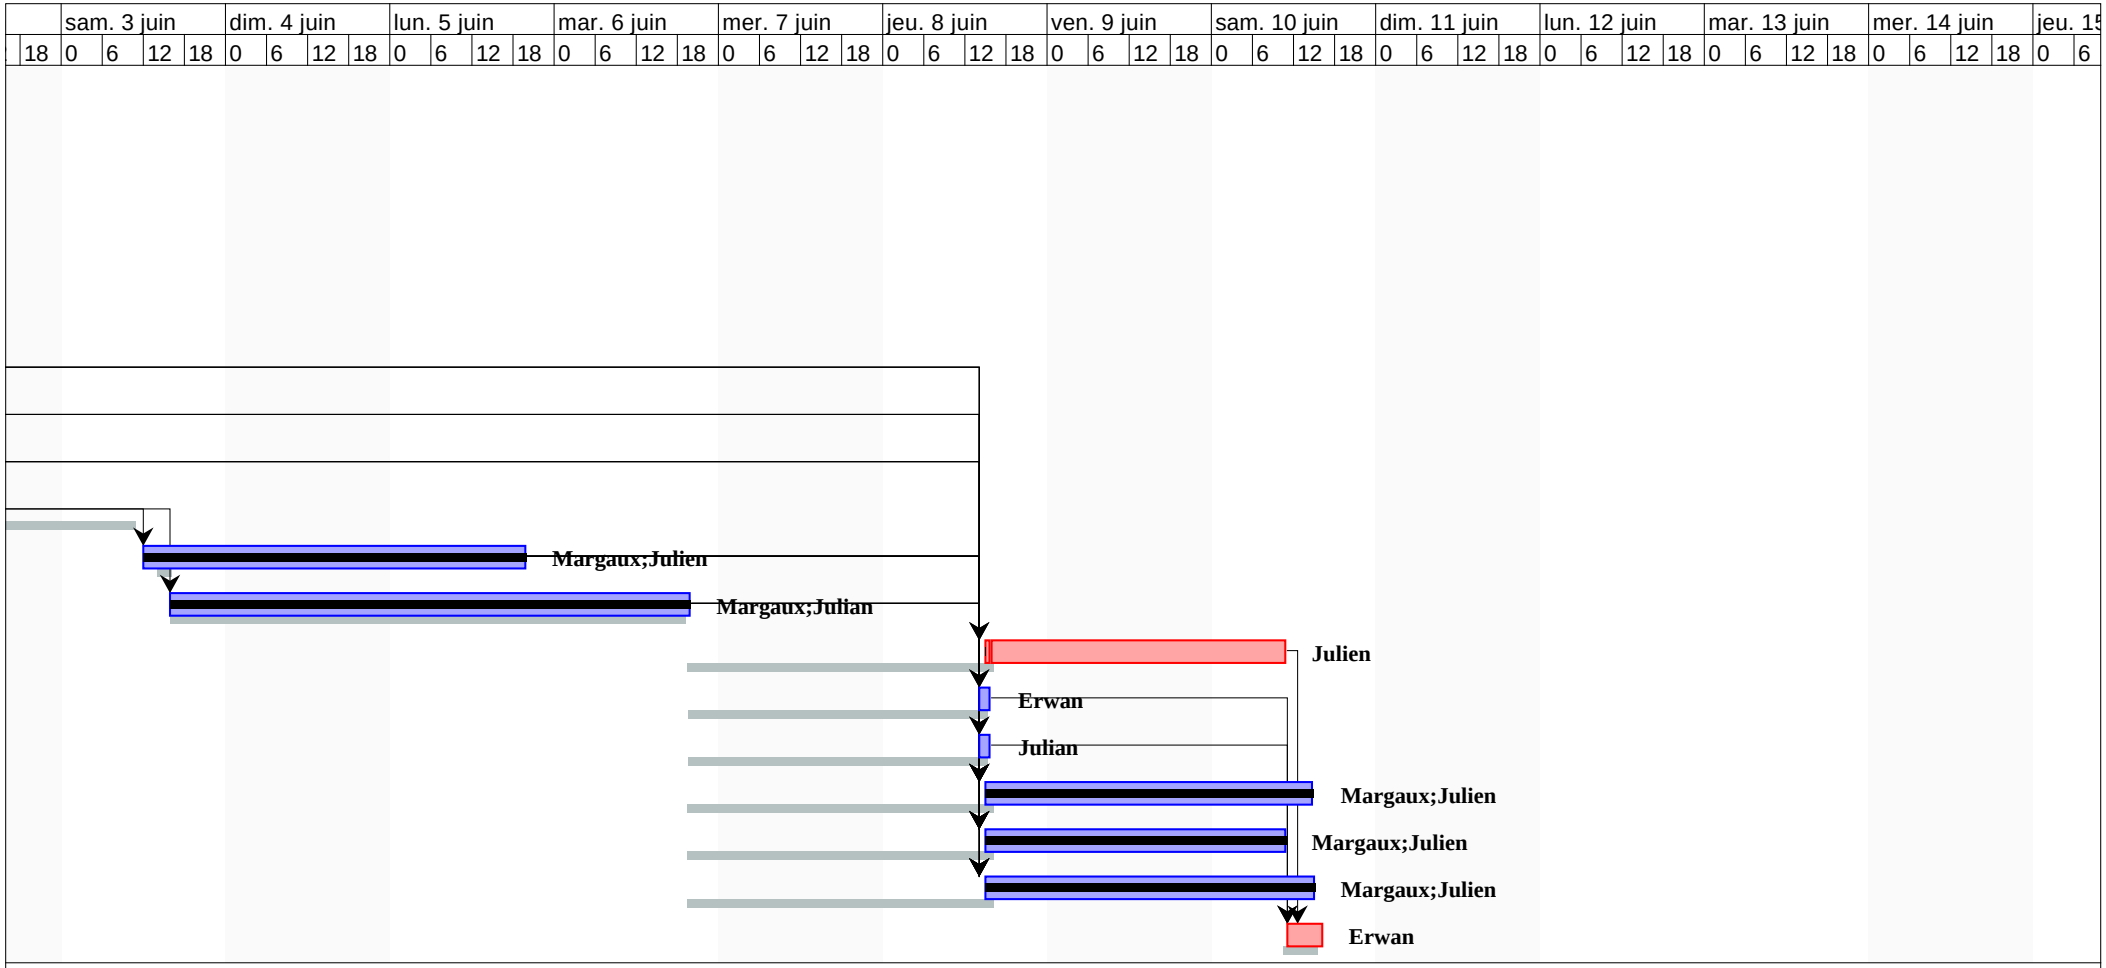
sam. 3 juin
dim. 4 juin
lun. 5 juin
mar. 6 juin
mer. 7 juin
jeu. 8 juin
ven. 9 juin
sam. 10 juin
dim. 11 juin
lun. 12 juin
mar. 13 juin
mer. 14 juin
jeu. 15
18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 0 6
Margaux;Julien
Margaux;Julian
Julien
Erwan
Julian
Margaux;Julien
Margaux;Julien
Margaux;Julien
Erwan

ProjetSAE201

Dates			
Start	23/05/23 19:00	Finish	10/06/23 16:30
Baseline Start	23/05/23 19:00	Baseline Finish	10/06/23 16:00
Actual Start	23/05/23 19:00	Actual Finish	06/06/23 20:00

Duration			
Scheduled	2,875 jours	Remaining	2,875 jours
Baseline	2,812 jours	Actual	0 jours
		Percent Complete	82 %

Work			
Scheduled	58,789 heures	Remaining	8 heures
Baseline	73 heures	Actual	50,789 heures

Costs			
Scheduled	3527,37 €	Remaining	480,00 €
Baseline	4380,00 €	Actual	3047,37 €
		Variance	672,63 €

Notes

Task Information

ID	Nom	Baseline	Baseline Start	Baseline Finish	Baseline	Baseline Cost
1	Evaluation des besoins via la	0,125 jours	23/05/23 19:00	25/05/23 15:30	6 heures	$ 360,00
2	Analyse comparative	0,597 jours	25/05/23 15:36	27/05/23 16:06	4 heures	$ 240,00
3	Charte Graphique	0,375 jours	25/05/23 15:30	27/05/23 15:00	3 heures	$ 180,00
4	Diagramme de Classe	0,375 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	3 heures	$ 180,00
5	Diagramme d'activité	0,375 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	3 heures	$ 180,00
6	Création de données de tests	0,625 jours	25/05/23 16:00	29/05/23 20:00	5 heures	$ 300,00
7	Données de Prestation	0,188 jours	27/05/23 15:30	29/05/23 19:15	5 heures	$ 300,00
8	Données de Facture	0,625 jours	27/05/23 15:30	29/05/23 19:15	5 heures	$ 300,00
9	Données de Réservation	0,625 jours	27/05/23 15:30	29/05/23 19:15	5 heures	$ 300,00
10	Maquettage	0,917 jours	29/05/23 19:00	03/06/23 11:00	5 heures	$ 300,00
11	Interface de Recherche	0,375 jours	03/06/23 14:09	03/06/23 16:30	4 heures	$ 240,00
12	Interface d'Affichage	1 jour?	03/06/23 16:00	06/06/23 19:30	4 heures	$ 240,00
13	Tests unitaires	0,375 jours	06/06/23 19:30	08/06/23 16:30	2 heures	$ 120,00
14	Tests d'acceptations	0,375 jours	06/06/23 19:30	08/06/23 15:30	2 heures	$ 120,00
15	Tests d'ergonomie	0,438 jours	06/06/23 19:30	08/06/23 15:30	2 heures	$ 120,00
16	Fonctions d'affichage	0,438 jours	06/06/23 19:30	08/06/23 16:30	4 heures	$ 240,00
17	Fonctions d'enregistrement	1 jour?	06/06/23 19:30	08/06/23 16:30	4 heures	$ 240,00
18	Fonctions de recherche	1 jour?	06/06/23 19:30	08/06/23 16:30	4 heures	$ 240,00
19	Rapport de bugs	1,062 jours	10/06/23 10:30	10/06/23 16:00	3 heures	$ 180,00

Task Information

ID	Nom	Durée	Début	Fin	Pourcentage terminé	Coût	Travail
1	Evaluation des besoins via la	0,312 jours	23/05/23 19:00	25/05/23 15:30	100 %	$ 360,00	6 heures
2	Analyse comparative	0,5 jours	25/05/23 15:36	27/05/23 16:06	100 %	$ 240,00	4 heures
3	Charte Graphique	0,125 jours	25/05/23 15:30	25/05/23 16:30	100 %	$ 60,00	1 heure
4	Diagramme de Classe	0,25 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 14:30	100 %	$ 120,00	2 heures
5	Diagramme d'activité	0,375 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	100 %	$ 180,00	3 heures
6	Création de données de tests	0,375 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	100 %	$ 180,00	3 heures
7	Données de Prestation	0,016 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	100 %	$ 30,00	0,5 heures
8	Données de Facture	0,016 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	100 %	$ 30,00	0,5 heures
9	Données de Réservation	0,016 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	100 %	$ 30,00	0,5 heures
10	Maquettage	0,375 jours	29/05/23 19:00	01/06/23 15:00	100 %	$ 180,00	3 heures
11	Interface de Recherche	0,375 jours	03/06/23 12:00	05/06/23 20:00	100 %	$ 360,00	6 heures
12	Interface d'Affichage	0,312 jours	03/06/23 16:00	06/06/23 20:00	100 %	$ 300,00	5 heures
13	Tests unitaires	0,25 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 11:00	50 %	$ 120,00	2 heures
14	Tests d'acceptations	0,25 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00	0 %	$ 120,00	2 heures
15	Tests d'ergonomie	0,25 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00	0 %	$ 120,00	2 heures
16	Fonctions d'affichage	0,567 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 15:02	100 %	$ 332,37	5,539 heures
17	Fonctions d'enregistrement	0,375 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 11:00	100 %	$ 240,00	4 heures
18	Fonctions de recherche	0,594 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 15:15	100 %	$ 345,00	5,75 heures
19	Rapport de bugs	0,375 jours	10/06/23 11:00	10/06/23 16:30	0 %	$ 180,00	3 heures

Task Information

ID	Nom	Début	Fin	Baseline Start	Baseline Finish	Début du	Terminer
1	Evaluation des besoins via la	23/05/23 19:00	25/05/23 15:30	23/05/23 19:00	25/05/23 15:30	0 jours	0 jours
2	Analyse comparative	25/05/23 15:36	27/05/23 16:06	25/05/23 15:36	27/05/23 16:06	0 jours	0 jours
3	Charte Graphique	25/05/23 15:30	25/05/23 16:30	25/05/23 15:30	27/05/23 15:00	0 jours	-0,25 jours
4	Diagramme de Classe	25/05/23 16:00	27/05/23 14:30	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	0 jours	-0,125 jours
5	Diagramme d'activité	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	0 jours	0 jours
6	Création de données de tests	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30	25/05/23 16:00	29/05/23 20:00	0 jours	-0,25 jours
7	Données de Prestation	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	27/05/23 15:30	29/05/23 19:15	0 jours	-0,141 jours
8	Données de Facture	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	27/05/23 15:30	29/05/23 19:15	0 jours	-0,141 jours
9	Données de Réservation	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37	27/05/23 15:30	29/05/23 19:15	0 jours	-0,141 jours
10	Maquettage	29/05/23 19:00	01/06/23 15:00	29/05/23 19:00	03/06/23 11:00	0 jours	-0,25 jours
11	Interface de Recherche	03/06/23 12:00	05/06/23 20:00	03/06/23 14:09	03/06/23 16:30	0 jours	0,125 jours
12	Interface d'Affichage	03/06/23 16:00	06/06/23 20:00	03/06/23 16:00	06/06/23 19:30	0 jours	0,062 jours
13	Tests unitaires	08/06/23 14:00	10/06/23 11:00	06/06/23 19:30	08/06/23 16:30	0,062 jours	0,062 jours
14	Tests d'acceptations	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00	06/06/23 19:30	08/06/23 15:30	0,062 jours	0,062 jours
15	Tests d'ergonomie	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00	06/06/23 19:30	08/06/23 15:30	0,062 jours	0,062 jours
16	Fonctions d'affichage	08/06/23 14:00	10/06/23 15:02	06/06/23 19:30	08/06/23 16:30	0,062 jours	0,255 jours
17	Fonctions d'enregistrement	08/06/23 14:00	10/06/23 11:00	06/06/23 19:30	08/06/23 16:30	0,062 jours	0,062 jours
18	Fonctions de recherche	08/06/23 14:00	10/06/23 15:15	06/06/23 19:30	08/06/23 16:30	0,062 jours	0,281 jours
19	Rapport de bugs	10/06/23 11:00	10/06/23 16:30	10/06/23 10:30	10/06/23 16:00	0,062 jours	0,062 jours

Who Does What

ID ressource	Ressource
1	Margaux

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
6	Création de données de tests	3 heures	100 %	0 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30
1	Evaluation des besoins via la	1,5 heures	100 %	0 jours	23/05/23 19:00	25/05/23 14:30
7	Données de Prestation	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
8	Données de Facture	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
18	Fonctions de recherche	2 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00
10	Maquettage	3 heures	100 %	0 jours	29/05/23 19:00	01/06/23 15:00
11	Interface de Recherche	3 heures	100 %	0 jours	03/06/23 12:00	05/06/23 20:00
4	Diagramme de Classe	2 heures	100 %	0 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 14:30
9	Données de Réservation	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
17	Fonctions d'enregistrement	2 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00
12	Interface d'Affichage	2,5 heures	100 %	0 jours	03/06/23 16:00	06/06/23 20:00
16	Fonctions d'affichage	2 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00
		21,375 heures				

ID ressource	Ressource
2	Julien

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
3	Charte Graphique	1 heure	100 %	0 jours	25/05/23 15:30	25/05/23 16:30
8	Données de Facture	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
13	Tests unitaires	2 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 11:00
1	Evaluation des besoins via la	1,5 heures	100 %	0 jours	23/05/23 19:00	25/05/23 15:30
11	Interface de Recherche	3 heures	100 %	0 jours	03/06/23 12:00	05/06/23 20:00
17	Fonctions d'enregistrement	2 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 11:00
16	Fonctions d'affichage	3,539 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 15:02
18	Fonctions de recherche	3,75 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	10/06/23 15:15
2	Analyse comparative	4 heures	100 %	0 jours	25/05/23 15:36	27/05/23 16:06
7	Données de Prestation	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37

ID ressource	Ressource					
9	Données de Réservation	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
		21,164 heures				

ID ressource	Ressource
3	Julian

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
12	Interface d'Affichage	2,5 heures	100 %	0 jours	03/06/23 16:00	06/06/23 20:00
5	Diagramme d'activité	3 heures	100 %	0 jours	25/05/23 16:00	27/05/23 15:30
1	Evaluation des besoins via la	1,5 heures	100 %	0 jours	23/05/23 19:00	25/05/23 14:30
15	Tests d'ergonomie	2 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00
9	Données de Réservation	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
7	Données de Prestation	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
8	Données de Facture	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
		9,375 heures				

ID ressource	Ressource
4	Erwan

ID tâche	Tâche	Travail	Unités d'affectation	retard	Début	Fin
7	Données de Prestation	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
9	Données de Réservation	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
19	Rapport de bugs	3 heures	100 %	0 jours	10/06/23 11:00	10/06/23 16:30
8	Données de Facture	0,125 heures	100 %	0 jours	27/05/23 15:30	27/05/23 15:37
4	Diagramme de Classe	0 heures	100 %	0,25 jours	27/05/23 14:30	27/05/23 14:30
1	Evaluation des besoins via la	1,5 heures	100 %	0 jours	23/05/23 19:00	25/05/23 14:30
14	Tests d'acceptations	2 heures	100 %	0 jours	08/06/23 14:00	08/06/23 16:00
		6,875 heures				
